

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

一、市政建設

01. 潮州街遛狗區優化工程

由於潮州街遛狗區出現積水及使用設施老化等問題，市政署開展了優化工程，主要包括更換石質地板、提升遛狗區現有平水、更換損毀設施、重新設計供排水規劃等，以完善區內設施。



施工圖片

02. 石排灣社區公共設施及過路設施優化計劃


石排灣社區公共設施及過路設施優化計劃於去年完成第一期工程，利用了蝴蝶谷大馬路之空置綠化帶改建為遛狗區，並優化了周邊綠化帶及行人路，以回應居民的使用需求及美化了社區環境，本年度將緊接開展第二及第三期工程。

現時，第二期工程正進行招標工作，工程包括鄰近石排灣圓形地兩地段之休憩區設置、和諧廣場及和諧大馬路交界之行人天橋優化。計劃會重新規劃休憩區及人流動線，優化區內之行人天橋及綠化環境。

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日


此外，第三期工程已完成相關設計，主要是優化和諧廣場兩側巴士站旁邊的行人道及重新規劃休憩區範圍，增設兒童遊樂區及康體設施區，並一併優化現有行人天橋及過路設施、重新規劃行人道、上落客貨區及巴士站、的士站空間等。

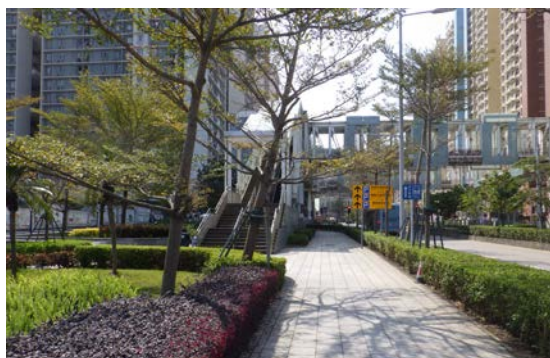

現況圖片（第二期）




效果圖（第二期）

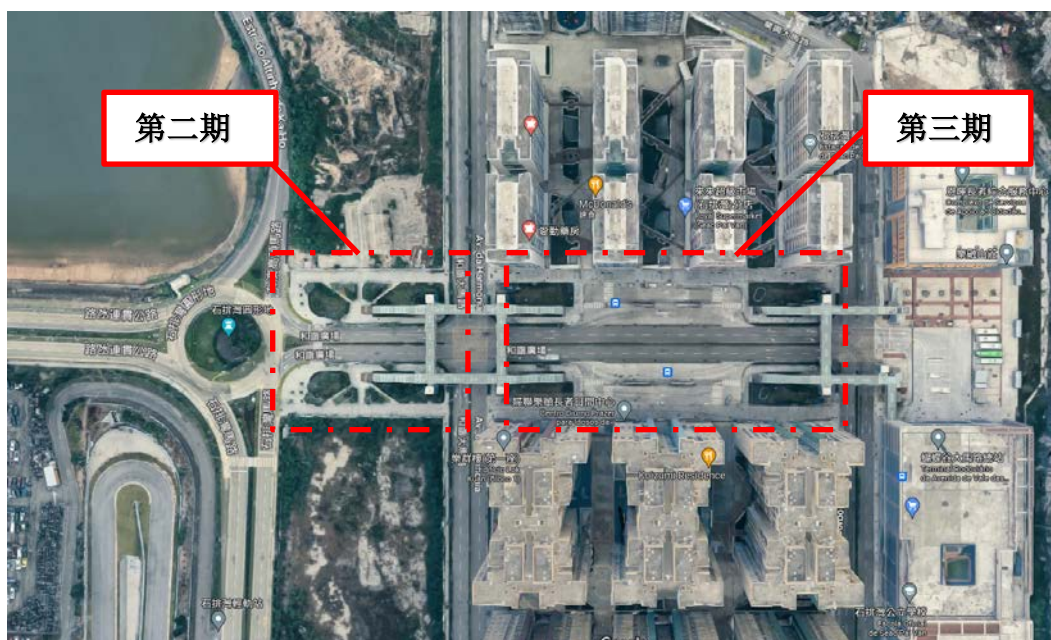

位置圖

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

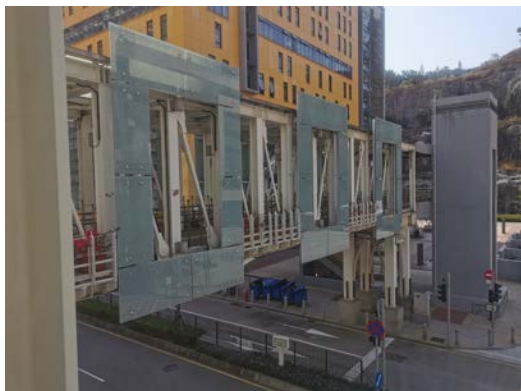

現況圖片（第三期）

03. 路環石排灣馬路業興大廈平台社區設施設計及建造工程

石排灣馬路業興大廈平台設施，已使用多年，出現損壞及經常維修的狀況，因此，市政署開展本工程計劃，對其作出改善，包括重鋪部份平台位置並更換為防滑材質飾面、對兒童設施進行重新設計、加設綠化帶、座椅、更換健身設施等，為市民創建更舒適的社區環境。

現時，有關工程正進行招標工作。



現況圖片

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

二、山坡整治工程

市政署持續監察全澳各區的山坡安全情況，並對有需要的山坡及懸石開展整治工程，以保障環境安全，同時防止山泥傾瀉、懸石滑落及改善山坡的排水系統；工程包括採用噴漿混凝土作護坡及安裝綠色包膠植生網以種植植物等方式，改善坡面綠化環境，提高坡面穩定性。

目前，氹仔信安馬路近華藝工業大廈山坡的懸石已被移走，氹仔嘉樂庇總督馬路茵景園後側的山坡整治工程正有序進行中。



氹仔信安馬路近華藝工業大廈山坡懸石
-竣工圖片



氹仔嘉樂庇總督馬路茵景園後側
-施工圖片

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

三、公廁優化翻新工程

為改善離島區現有公廁設施設備老化的問題，市政署持續優化該區的公廁，工程包括增設自動感應設備、無障礙廁格/廁所、無障礙洗手台、改善通風和排氣等，全面優化各個公廁，提升使用品質，並對具備空間條件的公廁增設哺乳室或親子廁所。

現時離島區已完成的公廁為氹仔客運碼頭旅遊巴停泊公廁(T17)，而氹仔客運碼頭公廁改善工程(T18)及望德聖母灣大馬路葡韻公廁正在施工中。另外，氹仔龍環葡韻公廁(T19)正在設計中。



T17 氹仔客運碼頭旅遊巴停泊區公廁
-完工圖片



T18 氹仔客運碼頭公廁改善工程
-施工圖片



望德聖母灣大馬路葡韻公廁-施工圖片



T19 氹仔龍環葡韻公廁-效果圖片

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

四、行人道優化工程

01. 澳門離島區無障礙設施改善工程(第一期)

市政署計劃開展離島區無障礙設施改善工程，逐步為離島優化行人過路設施。

本計劃第一期主要改善路環舊市區、黑沙公園周邊及黑沙龍爪角海濱路的行人過路設施，工程將分階段施工，第一階段工程範圍主要為路環碼頭前地至到馬忌士前地片區，當中涉及船人街、恩尼斯總統前地及十月初五馬路行人道等各街道的行人過路處，第二階段則由老人圍至譚公廟片區，待路環舊市區完成後再開展黑沙公園周邊及黑沙龍爪角海濱路的行人過路設施，工程內容主要是降低行人路面與行車路面之間的高差，以及維修凹凸不平的行人路面等，方便輪椅使用者或行動不便人士易於通行。另外，亦會在每個路口鋪設「警示磚」，提醒盲人及視覺障礙的人士已處於路口，橫過馬路時注意安全。



路環舊市區



黑沙公園周邊


離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

02. 竹灣馬路至黑沙海灘行人道優化工程

近年，市政署已完成由路環市區至竹灣泳池的竹灣馬路行人道優化工程，以便居民及遊客可以漫步並沿途欣賞路環美景。考慮到竹灣馬路至黑沙海灘的行人道亦使用多年，部分路面已出現不同程度的損壞，且部分路段寬度較窄，對行人通行容易構成危險，因此，市政署正安排招標，進一步完善步行環境。

工程範圍由竹灣燒烤公園巴士站至鄰近黑沙海灘的海蘭花園，將安排由竹灣燒烤公園巴士站開始，分階段擴闊、重鋪、重造和加設外側行人道護欄；按交通部門要求修改行車道及加設過路設施；於竹灣豪園及海蘭花園行人路一帶加設綠化帶，完善無障礙通行設施，以及現有路燈及路面設施配合移位等。

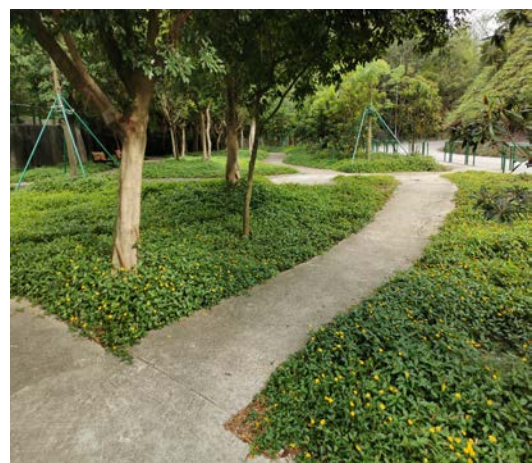

現況圖片

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

五、重鋪瀝青及鋼筋混凝土路面


市政署持續檢視離島區行車路面的使用情況，將按路面損耗程度有序地安排相關的重鋪工作，以保障道路使用者安全。

目前，氹仔學院路、海灣圍、竹灣馬路及黑沙馬路等道路已竣工；而氹仔北京街道路優化工程已判給，正協調後續相關工作。另外，氹仔奧林匹克大馬路及路環田畔街等路面的優化工程正進行編制計劃。


	
氹仔學院路-完工圖片	海灣圍-完工圖片
	
竹灣馬路-完工圖片	黑沙馬路-完工圖片

離島區


各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

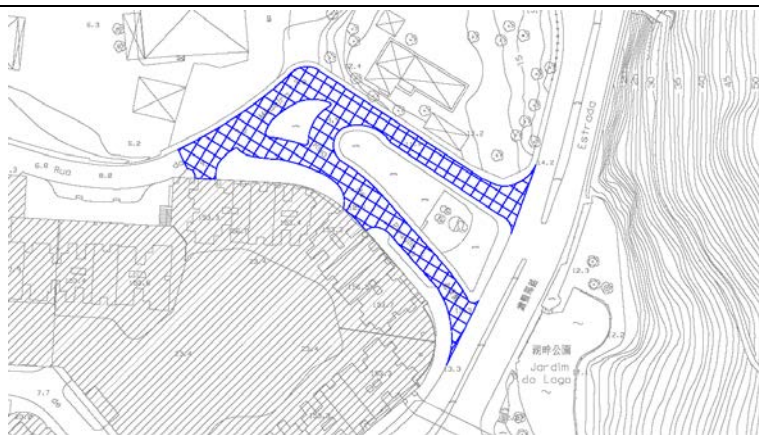

氹仔北京街-工程位置

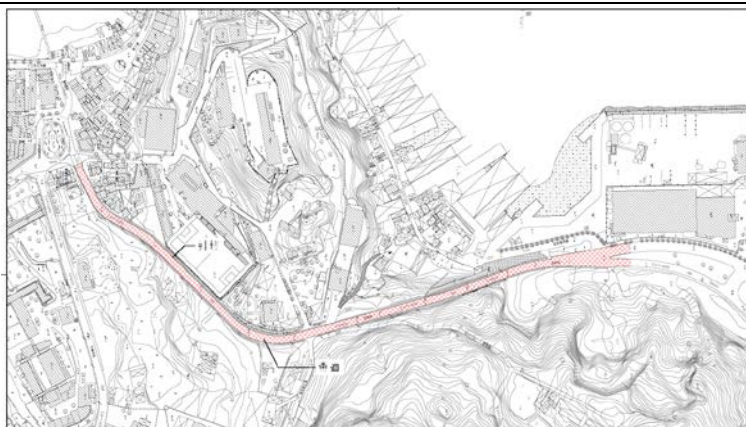

路環田畔街-工程位置

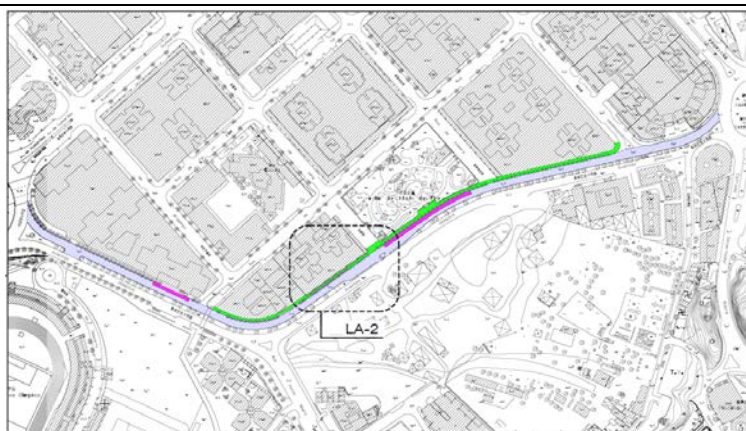

氹仔奧林匹克大馬路-工程位置

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

六、下水道及道路工程

01.路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程

市政署去年開展了路環九澳高頂馬路污水泵房渠改善工程，建造一條長度約 1295 米的污水泵房渠，替換已經損壞的渠道及改善道路路面損壞的情況，以保持該區排水系統的暢通，同時，以瀝青重鋪行車路面，保障行車安全。

題述工程已基本完成，現正協助公共建設局進行九澳高頂馬路與蝴蝶谷大馬路交界位置，即雲石廠對出路口的擴闊道路工作，工程涉及調整綠化帶、增加行車道、改變路型等工作，預計 3 月中旬完成。

由於上述道路擴闊工程仍在施工，目前只有石排灣圓形地與蝴蝶谷大馬路之間的一段九澳高頂馬路仍然封閉，其餘路段的九澳高頂馬路已開放交通通行，請駕駛者留意交通部門發出的最新交通安排。



完工圖片



施工圖片

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

七、垃圾壓縮桶站

為減少垃圾收集次數，避免交通阻塞，市政署持續優化全澳各區的垃圾站，把具備條件的小型垃圾站改建為垃圾壓縮桶站，增加區內的垃圾處理量，同時改善本澳整體環境衛生。

目前，市政署正進行垃圾壓縮桶站第十期工程，就離島區內擎天匯停車場外的垃圾壓縮桶站現時已基本完工，其餘鄰近金峰南岸金翠峰、御名峰及擎天匯 1、2 座等位置的垃圾壓縮桶站正協調交通安排，將分階段施工。



擎天匯停車場外垃圾壓縮桶站



金峰南岸金翠峰外垃圾壓縮桶站



金峰南岸御名峰外垃圾壓縮桶站



擎天匯 1、2 座外垃圾壓縮桶站

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

八、綠化工作

1. 山林修復(第五期)

第五期山林修復計劃地點包括：九澳高頂馬路南側 C 區、九澳山、金像農場及九澳水庫北側，面積共 35 公頃，根據廣東省林業科學研究院實地調研顯示，由於各區域的林相受損差異及地形條件限制，故依實況編制各區域修復方案，有林相修復專區和生態修復專區。九澳高頂馬路南側 C 區為林相修復專區，九澳山、金像農場及九澳水庫北側為生態修復專區。

九澳高頂馬路南側C 山林修復平面佈局圖 比例/SCALE 1:2500 	九澳山 山林修復平面佈局圖 比例/SCALE 1:2500 
九澳高頂馬路南側 C 區(林相修復專區)	九澳山(生態修復專區)
金像農場 山林修復平面佈局圖 比例/SCALE 1:2500 	九澳水庫北側 山林修復平面佈局圖 比例/SCALE 1:2500 
金像農場(生態修復專區)	九澳水庫北側(生態修復專區)

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

各區域已於 2022 年 11 月開始有序進行對原有樹木保留，清理藤本植物、枯危樹及外來入侵植物，開闢小型運輸通道、開挖樹穴及進行土壤改善等工序。預計 2023 年 3 月開始種植並於第三季完成植苗 35,000 株。

	
完成開行疏通	營建簡易運輸林道

2. 氹仔中央公園綠化改善計劃

本署計劃針對氹仔中央公園兩個兒童遊戲設施區周邊的花槽綠化帶進行綠化改善，改善面積約 500 平方米，將通過種植觀葉及造型植物，改善綠化植物老化或色彩單一等情況，以增加園內色彩，為市民提供更優質的綠化空間，預計本年第二季下旬完成。

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日



3. “填空白 提質量” 社區綠化優化


本署貫徹落實“填空白、提質量”的綠化策略發展的施政方針。

2022 年第四季至 2023 年 1 月已完成離島區「填空白」綠化地點有：氹仔市政花園優化工程壓縮式垃圾站建造、路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程和飛能便度街。

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

氹仔市政花園優化工程壓縮式垃圾站建造

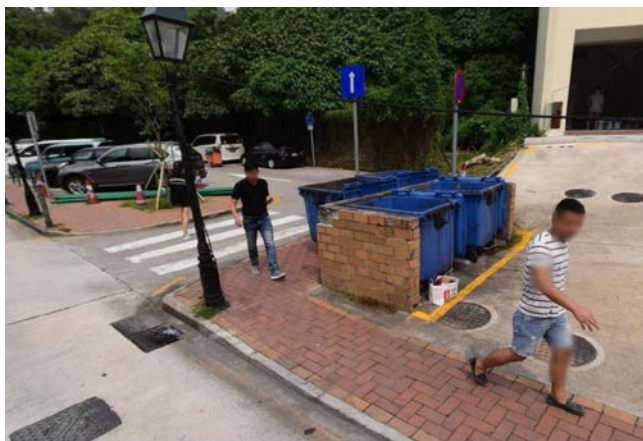

種植前



種植後

路氹城蓮花路排水系統重整及新泵站建造工程



種植前




種植後

飛能便度街

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

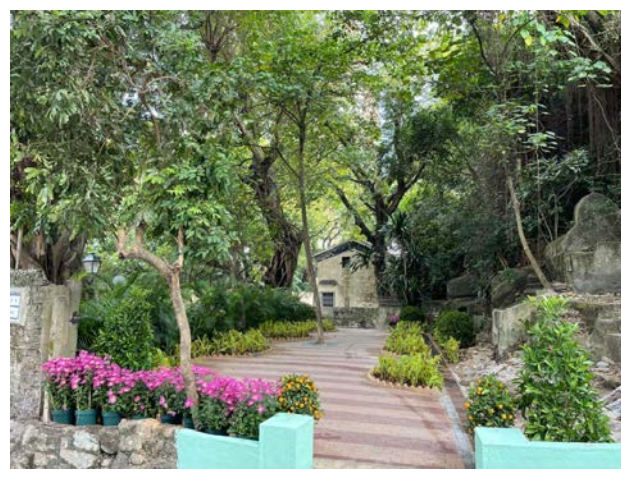	
種植前	種植後

2022 年第四季至 2023 年 1 月已完成離島區「提質量」綠化地點有：東亞運大馬路、機場大馬路、氹仔市政花園優化工程 (近山邊一段)、和諧圓形地、蓮花單車徑，種植觀葉、觀花和造形的植物。

東亞運大馬路	
	
種植前	種植後

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

機場大馬路




種植前




種植後

氹仔市政花園優化工程 (近山邊一段)

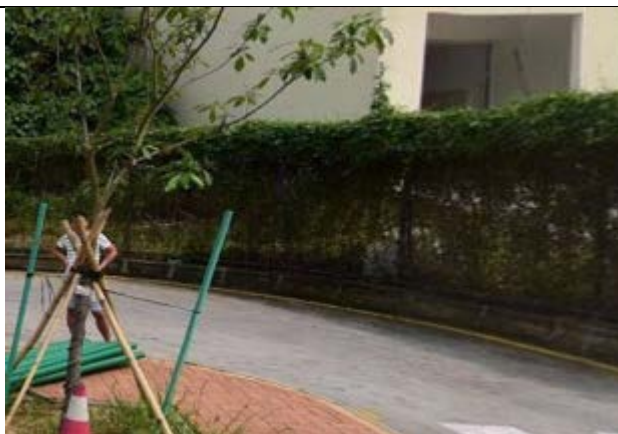

種植前

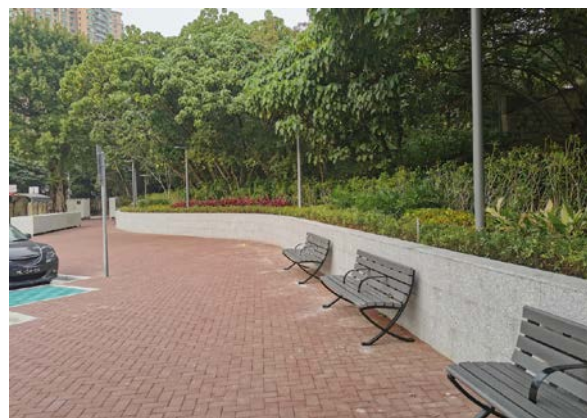

種植後

和諧圓形地

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

	
種植前	種植後
蓮花單車徑	
	
種植前	種植後

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

和諧圓形地新植 34 株賞花小喬木紫薇，增加植栽景觀層次和色彩效果。

和諧圓形地植樹



本年第一季至第二季計劃將對離島部分區域進行綠化優化工作，地點有：路氹城圓形地、徐日昇寅公圓形地、機場大馬路行人道綠化、史伯泰海軍將軍馬路、龍環葡韻周邊行人道及設施優化工程，目的為逐步提升離島區人行空間綠化質量，讓市民擁有舒適的步行環境。

離島區

各項市政建設 - 2023 年 3 月 8 日

	
切勿為一時之便踐踏綠化帶	禁止寵物於綠化帶便溺

4. 石排灣郊野公園香徑藥谷生態園區竹類藥用植物展示區之木棧道重整計劃

香徑藥谷生態園區竹類藥用植物展示區之木棧道始建於 2014 年，全長約 120 米，為全木結構，當初是由本署員工以土法方式手工釘裝建造而成。歷經 7 年使用，木棧道出現不同程度的損壞情況。市政署於 2022 年 12 月 12 日起，進行石排灣郊野公園香徑藥谷生態園區竹類藥用植物展示區之木棧道重整計劃，以優化設施管理。

施工期間，香徑藥谷生態園區及南藥園之自然導賞團體預約服務及透過「綠化設施預約系統（個人）」之個人預約服務將如常接受申請，僅竹類藥用植物展示區進行圍封，預計工期約 120 天。

